

Månedsrapport Juni 2022

NKOM Nord-Gudbrandsdalen




Innholdsfortegnelse

Status feltoversikt.....	3
Videre fremdrift.....	9

Status feltoversikt

FIBER-EIDEFOSS-NKOM-BLÆSTERGRENDI TOFTEMO

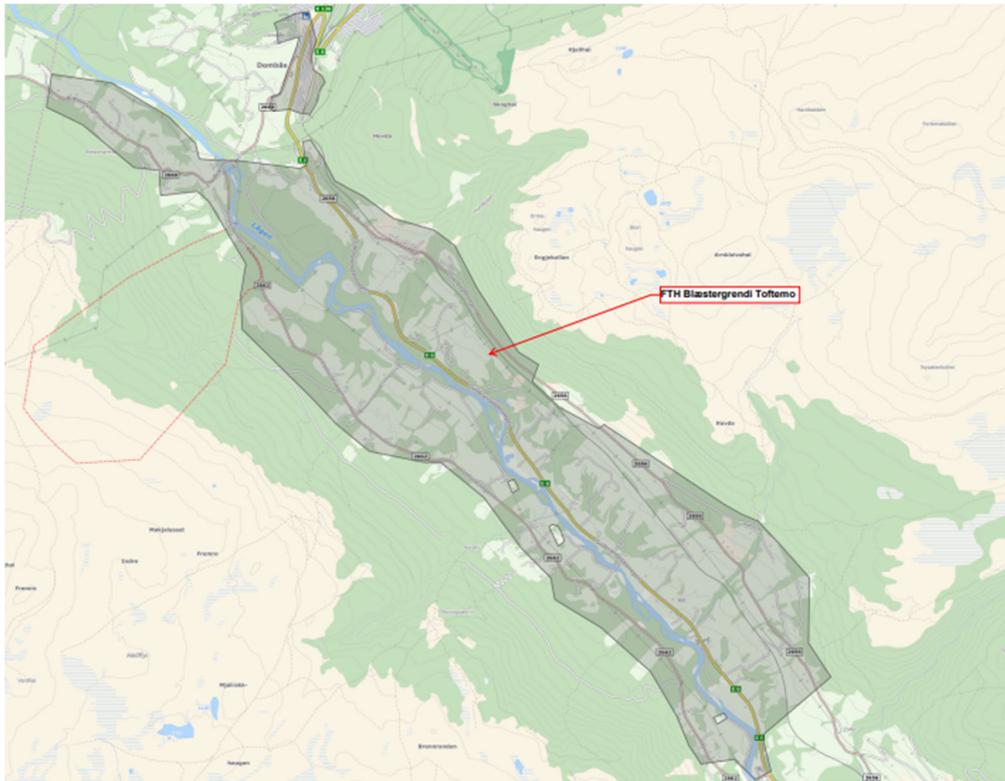


FIBER-EIDEFOSS-NKOM-BLÆSTERGRENDI TOFTEMO blir utført som en entreprise og bygges i egenregi av Eidefoss Fiber. Kontrakten består samlet av 231 salgbare adresser.

Fjellnett har ferdigstilt stolpekontroll og bytting av lavspentmaster er påbegynt. Men omfanget av dårlige stolper er mye større enn antatt, og Eidefoss fiber har måtte omprosjekttere deler av feltet. Området på østsiden av elva vil bli gravd/hengt opp på lavspentstolper/telefonstolper. Node tomt er nå avklart med grunneier, og blir montert 1. august.


Fremdrift				
Aktivitet	% Gjennomført	Total mengde	Totalt utført	Enhet
Stolpebytte	9,61538462	104	10	stk
Strekking HS	0	1000	0	Meter
Strekking LS	0	30000	0	Meter
Graving	0	4500	0	Meter
Utlevering rør	0	94	0	stk
Blåsing	0	34000	0	Meter
Kundemontering	0	94	0	Stk
Node	30	100	30	%
Kundeoppkoblinger	0	94	0	Stk

FIBER-EIDEFOSS-NKOM-GRÅVÅMELLOM TOSTADSKRIU

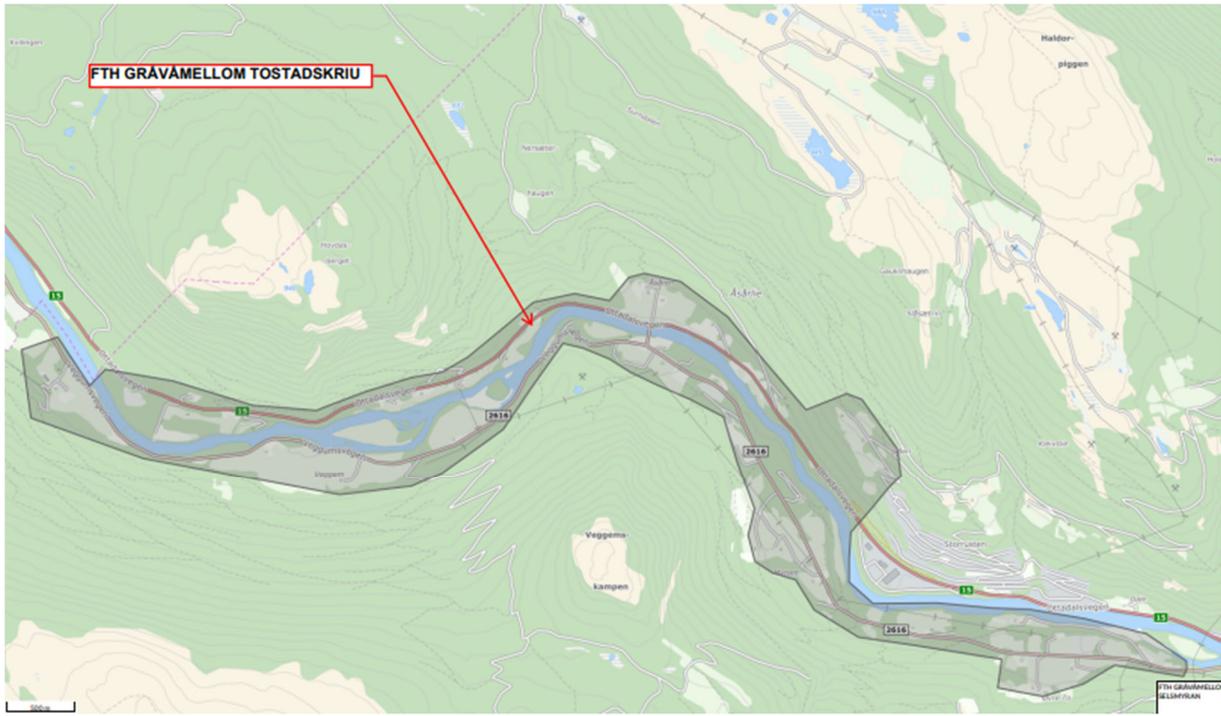

Feltet ble ferdig utbygd i 2021. Det gjenstår pr. nå en kunde som venter på frostfri bakke for å kunne grave over egen eiendom.

FIBER-EIDEFOSS-NKOM-SKOGBYGDI

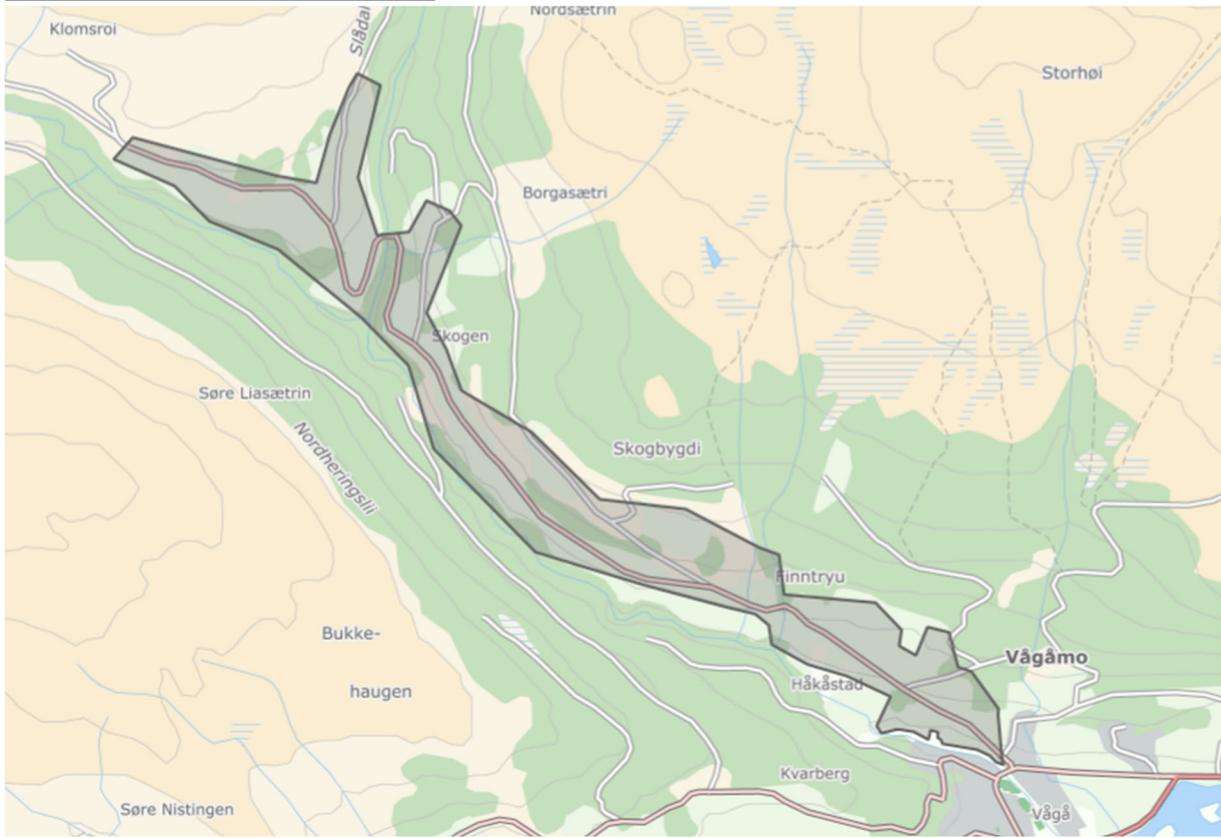

FIBER-EIDEFOSS-NKOM-SKOGBYGDI blir utbygd som eget prosjekt i regi av Eidefoss Fiber. Området består av 211 salgbare adresser.


Kvaliteten på HS master var dårlig, og Fjellnett har besluttet å grave ned deler av HS nettet gjennom området. Dette forsinket utbyggingen av fiber.

Arbeider pågår i området, stolpebytte på LS-nettet er nesten ferdigstilt. Graving av HS-nettet startet opp i mai.

PR nå er det koblet opp 16 abonnementer, innmontering er utført på 96 adresser. Det blir opphenging av LS-kretser og blåsing utover sommeren. Det gjenstår å strekke på HS-linje over elvekryssing.

Fremdrift				
Aktivitet	% Gjennomført	Total mengde	Totalt utført	Enhet
Stolpebytte	90	100	90	stk
Strekking HS	100	700	700	Meter
Strekking LS	2,5	12000	300	Meter
Graving HS	10	8000	800	Meter
Graving LS	75	2000	1500	Meter
Utlevering rør	33,3333333	30	10	stk
Blåsing	23,8461538	26000	6200	Meter
Kundemontering	97,9591837	98	96	Stk
Node	100	100	100	%
Kundeoppkoblinger	14,2857143	98	14	Stk

FIBER-EIDEFOSS-NKOM-LESJASKOG TIL LESJEVERK

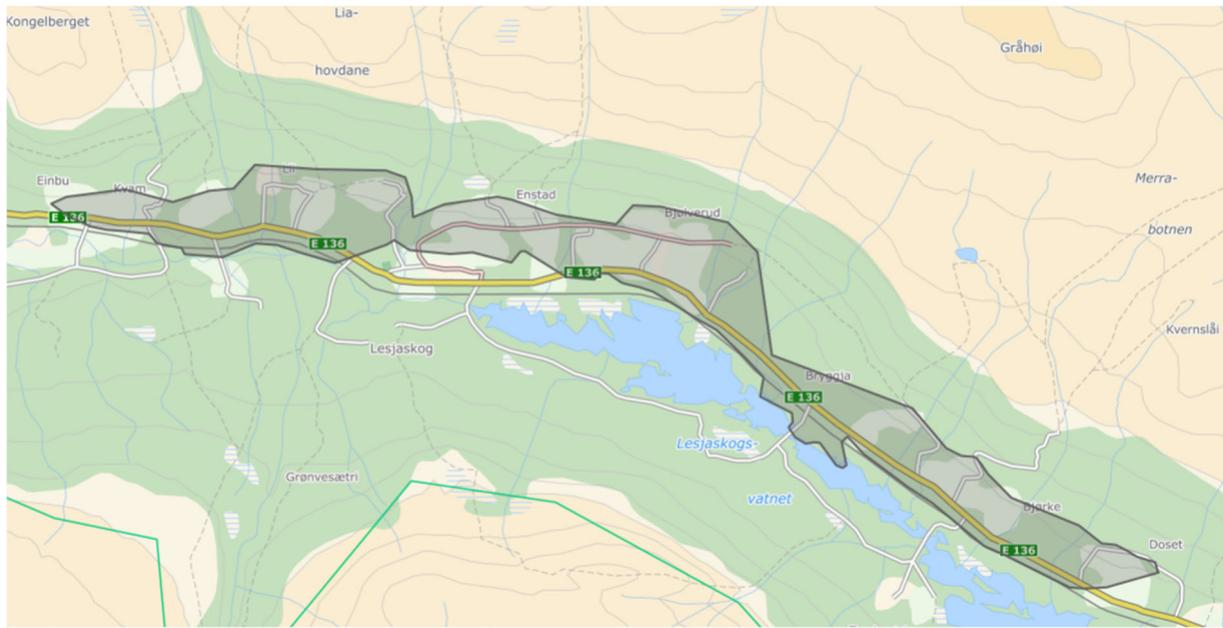


FIBER-EIDEFOSS-NKOM-LESJASKOG TIL LESJEVERK bygges ut av Oneco. Det er 149 salgbare adresser.

Ferdigbefaring ble gjennomført første uka i juli. Det gjenstår 4 adresser som skal grave på egen eiendom.

Fremdrift				
Aktivitet	% Gjennomført	Total mengde	Totalt utført	Enhet
Stolpebytte	100	48	48	stk
Strekking HS	100	19388	19388	Meter
Strekking LS	100	16200	16200	Meter
Graving	100	2500	2500	Meter
Utlevering rør	100	15	15	stk
Blåsing	100	18000	18000	Meter
Kundemontering	100	73	73	Stk
Node	100	100	100	%
Kundeoppkoblinger	100	73	73	Stk

FIBER-EIDEFOSS-NKOM-SELSEMYRAN CWDM

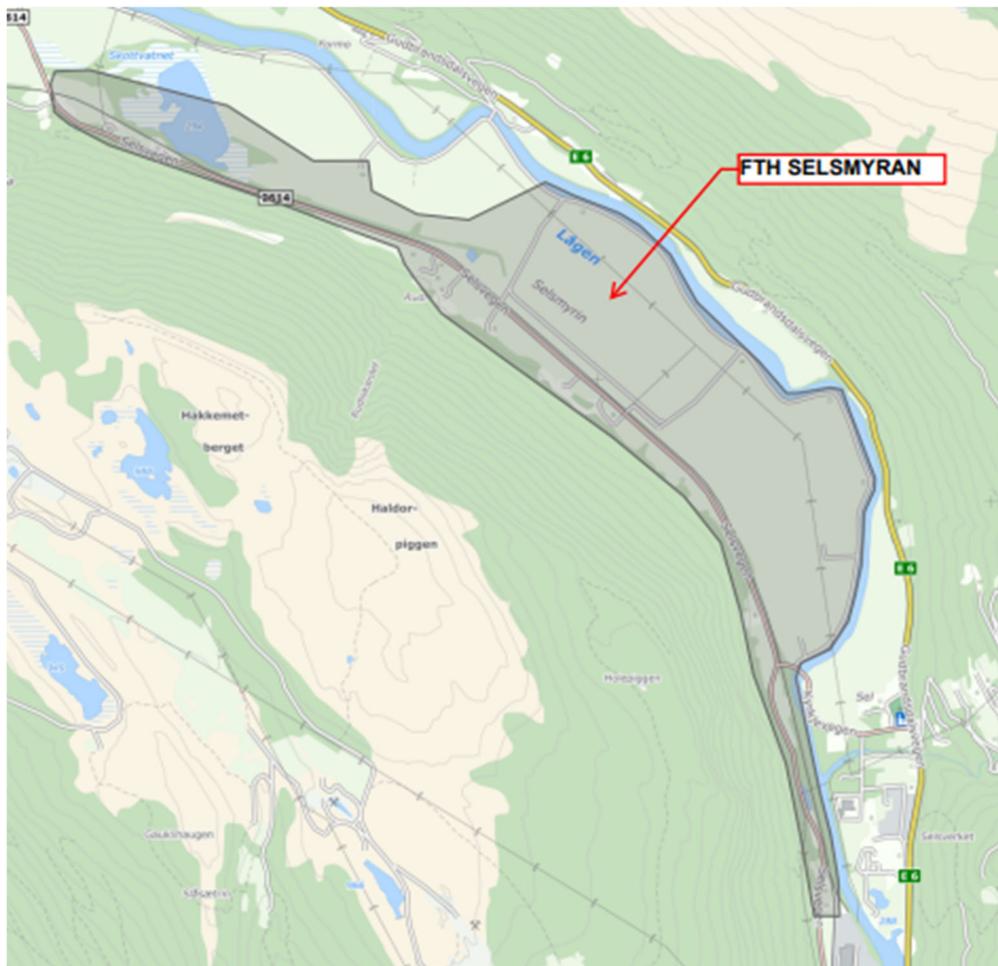

FIBER-EIDEFOSS-NKOM-SELSEMYRAN CWDM bygges ut av Eidefoss fiber, det er 33 salgbare adresser. Graving pågår, det gjenstår å strekke over jernbanen. Venter på godkjenning av søknad her. Deler av gravingen må vente til etter at innhøsting er gjort til høsten. Node er ferdig montert.

Fremdrift				
Aktivitet	% Gjennomført	Total mengde	Totalt utført	Enhet
Stolpebytte	100	5	5	stk
Strekking HS	70	1000	700	Meter
Strekking LS	0	1200	0	Meter
Graving	45,4545455	5500	2500	Meter
Utlevering rør	45,4545455	11	5	stk
Blåsing	0	6700	0	Meter
Kundemontering	0	21	0	Stk
Node	100	100	100	%
Kundeoppkoblinger	0	21	0	Stk

FIBER-EIDEFOSS-NKOM-LIAGRENDI



FIBER-EIDEFOSS-NKOM-LIAGRENDI bygges ut av Eidefoss fiber, det er 185 salgbare adresser. Deler av HS-nettet var så dårlig at Fjellnett har besluttet å grave ned deler av gjennomgående forsyning. Dette er et omfattende arbeide og forsinket store deler av feltet. Graving pågår. Det er startet opp med blåsing av stamnett og opphenging på LS-kretser. Har hatt problemer med tette rør på stamnettet. Utbedring pågår. Node er ferdig montert og klar med lys.

Stolpe bytte og opphenging på LS-kretser pågår.

Fremdrift				
Aktivitet	% Gjennomført	Total mengde	Totalt utført	Enhet
Stolpebytte	75	100	75	stk
Strekking HS	100	4500	4500	Meter
Strekking LS	10	14000	1400	Meter
Graving	52,5	20000	10500	Meter
Utlevering rør	50	20	10	stk
Blåsing	4,3902439	41000	1800	Meter
Kundemontering	0	98	0	Stk
Node	100	100	100	%
Kundeoppkoblinger	0	98	0	Stk

Videre fremdrift

	okt.21	nov.21	des.21	jan.22	feb.22	mar.22	apr.22	mai.22	jun.22	jul.22	aug.22	sep.22	okt.22	nov.22	des.22
FIBER-EIDEFOSS-NKOM-LIAGRENDI															
Stolpebytte															
Strekking HS															
Strekking LS															
Graving LS															
Graving HS															
Utlevering rør															
Blåsing															
Kundemontering															
Node															
Kundeoppkoblinger															

	okt.21	nov.21	des.21	jan.22	feb.22	mar.22	apr.22	mai.22	jun.22	jul.22	aug.22	sep.22	okt.22	nov.22	des.22
FIBER-EIDEFOSS-NKOM-SKOGBYGDI															
Stolpebytte															
Strekking HS															
Strekking LS															
Graving LS															
Graving HS															
Utlevering rør															
Blåsing															
Kundemontering															
Node															
Kundeoppkoblinger															

	okt.21	nov.21	des.21	jan.22	feb.22	mar.22	apr.22	mai.22	jun.22	jul.22	aug.22	sep.22	okt.22	nov.22	des.22
FIBER-EIDEFOSS-NKOM-BLÆSETERGRENDI TOFTEMO															
Stolpebytte															
Strekking HS															
Strekking LS															
Graving LS															
Graving HS															
Utlevering rør															
Blåsing															
Kundemontering															
Node															
Kundeoppkoblinger															

	okt.21	nov.21	des.21	jan.22	feb.22	mar.22	apr.22	mai.22	jun.22	jul.22	aug.22	sep.22	okt.22	nov.22	des.22
FIBER-EIDEFOSS-NKOM-SELSMYRAN CWDM															
Stolpebytte															
Strekking HS															
Strekking LS															
Graving															
Utlevering rør															
Blåsing															
Kundemontering															
Node															
Kundeoppkoblinger															
